


Prüfprotokoll für den Messaufbau bei Kaskadenschaltung

MK B4: Kaskadenschaltung

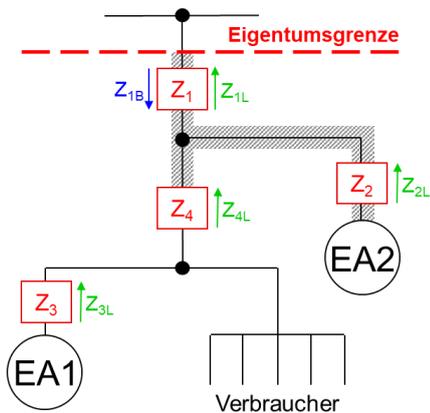

Z₁: Zähler für Bezug und Lieferung
 Z₂, Z₃, Z₄: Zähler für Lieferung

Anmeldenummer: _____

Bei Fragen zum Prüfprotokoll können Sie sich an das Postfach@.... wenden.

1.) Zählerbeschriftung:

Z₁ = Zählnummer:

Z₂ = Zählnummer:

Z₃ = Zählnummer:

Z₄ = Zählnummer:

Weitere Zähler:

Zählerbeschriftung wurde durchgeführt und auf Zuordnung nach dem Messkonzept B4 Kaskadenschaltung geprüft.
Im schraffierten Bereich sind keine Verbraucher angeschlossen!

Ja

2.) Anlagenzuordnung wurde geprüft:

EA1 = Energieträger....., Leistung.....

EA2 = Energieträger....., Leistung.....

3.) Prüfung der Messwerte:

a.) EA1 in Betrieb, EA2 außer Betrieb

- Energiemenge der Erzeugung an Z_{2L} bleibt unverändert
- Einspeiseenergiemenge an Z_{4L} ist gleich groß wie an Z_{1L}
- Energiemenge der Erzeugung an Z_{3L} ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z_{4L}

b.) EA1 außer Betrieb, EA2 in Betrieb

- Energiemenge der Erzeugung an Z_{3L} bleibt unverändert
- Energiemenge der Einspeisung an Z_{4L} bleibt unverändert
- Energiemenge der Erzeugung an Z_{2L} ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z_{1L}

c.) EA1 und EA2 in Betrieb

- Energiemenge der Erzeugung an Z_{3L} ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z_{4L}
- Energiemenge der Erzeugung an Z_{2L} ≥ Energiemenge der Einspeisung an (Z_{1L}-Z_{4L})
- Energiemenge der Einspeisung an Z_{1L} ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z_{4L}

Sobald eine Prüfung nicht mit "Ja" angekreuzt wurde, muss der Messaufbau nochmals geprüft werden.

Datum:

Unterschrift der Elektrofachfirma:

Datum:

Unterschrift des Anlagenbetreibers

Bitte schicken Sie das unterschriebene Protokoll per Post an
 oder an die Email-Adresse@.... zurück.
